



## Styresak 004-2023

### Tertialrapport 3-2022 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler: Helge Antonsen

Dato dok: 27.01.2023

Møtedato: 22.02.2023

Vår ref: 2019/4546

Vedlegg (t): Tertialrapport 3-2022 pr 31.12.2022 (*u.off. Offl. §13 Fvl §13*)

#### Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

#### Bakgrunn:


Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 3-2022 (status pr. 31.12.2022) for byggeprosjektet NLSH Somatikk Bodø - Byggetrinn 2 med følgeprosjekter.

Status ble sist rapportert i styresak 085-2022 (Tertialrapport 2-2022).

#### Perspektivskisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3.



## Plantegning som viser fløybetegnelser

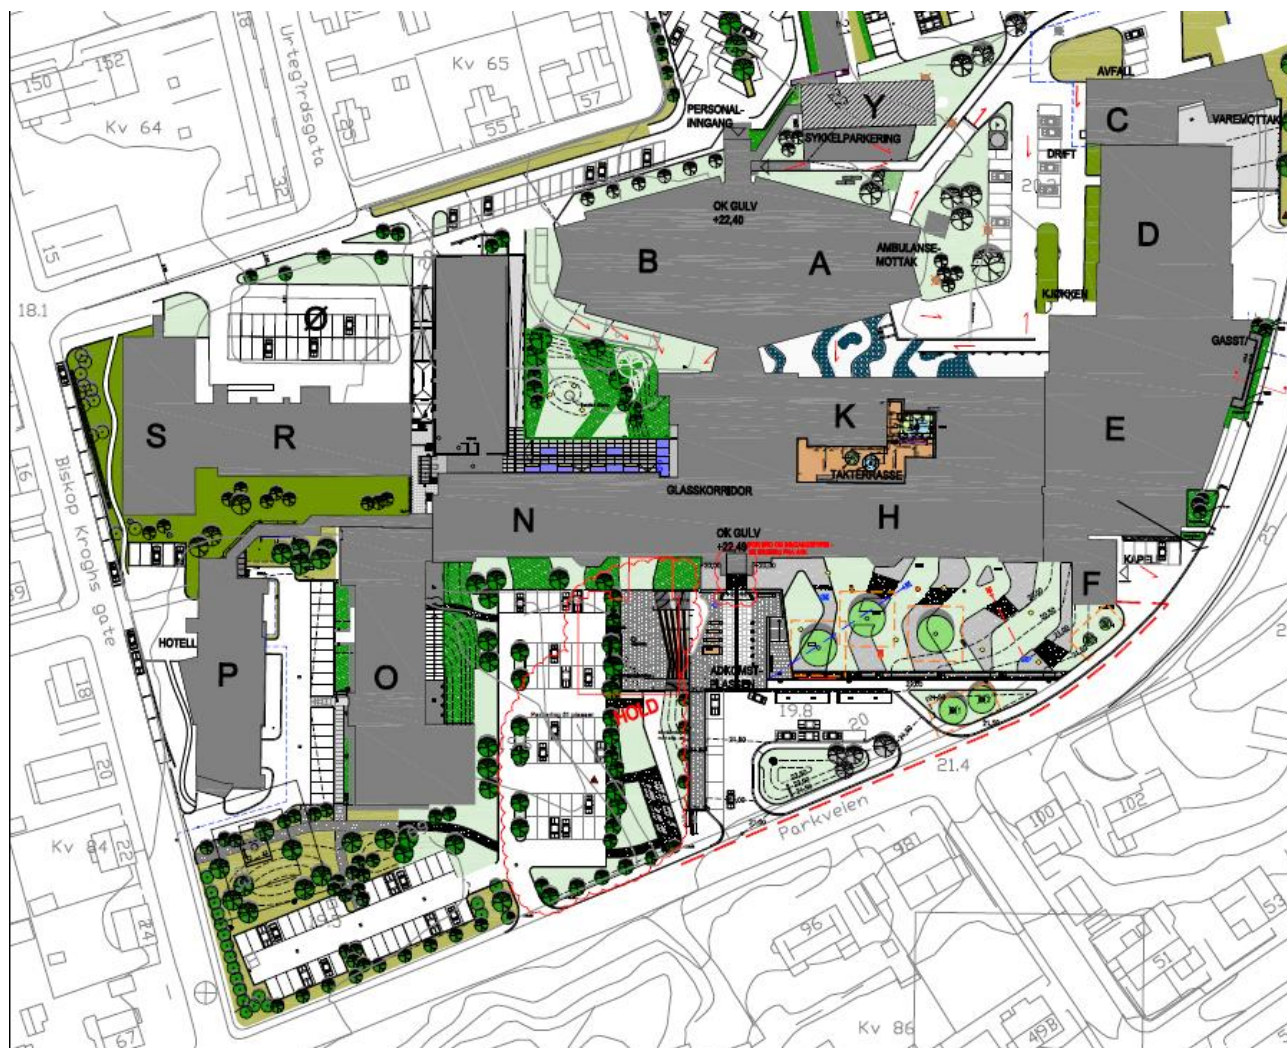

Tertialrapporten omhandler arbeider som er definert som tilhørende Byggetrinn 2 og som derfor inngår i gjeldende budsjettramme for prosjektet. Videre er tilleggskrav fra Luftfartstilsynet knyttet til oppgradering av helikopterplattform med permanent skumanlegg omtalt, selv om dette ikke inngår i det opprinnelige Byggetrinn 2.

## 1.0 STATUS ØKONOMI

Helse Nord, styresak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, fastsatte rammen på kr.1.562.927.999 for byggetrinn 2 - Fase 3 og totalrammen på kr.4.207.000.000 for byggeprosjekt Bodø.

Den siste prognosen for byggetrinn 2 har følgende tall:

Fase 1 og 2	Alle kostnader		<b>kr 2 643 826 340</b>
Fase 3	Generelle og spesielle kostnader	kr 180 300 000	
	Andel tidligfase(før 2005) fordelt til fase 3	kr 26 214 529	
	Entreprenøskostnader	kr 1 236 413 470	
	Brukerutstyr	kr 120 000 000	
	<b>Sum fase 3</b>		<b>kr 1 562 927 999</b>
<b>Totalt:</b>			<b>kr 4 206 754 339</b>

Det er registrert et forbruk i prosjektrengskapet på ca 1,14 mill. kr siste tertial. Forrige tertial ble det utbetalt ca 0,5 mill. kr. Pr 20.01.23 gjenstår ca 11 mill. kr av rammen til fremtidig utbetaling.

## 2.0 BYGGESTATUS OG VIDERE ARBEIDER

Fase 3, hvor hoveddelen av arbeidene har vært knyttet til renovering og utvidelse av fløy AB (høyblokka), er nå i all hovedsak ferdigstilt. Fløy A ble tatt i bruk i juni 2018 og Fløy B vinteren 2020. Diverse etterarbeider som har pågått fra høsten 2020 til høsten 2021, er tatt fortløpende i bruk. Etter de siste vedtak som er gjort avsluttes byggetrinn 2 etter Fase 3.

Pågående og gjenstående etterarbeider:

- 1. Resterende innvendige kompletteringer og slutføringer:** Det gjenstår fortsatt noen kompletterende innvendige etterarbeider, bl.a. som følge av tidligere rokader og tilhørende etablering av midlertidige lokaler i prosjektperioden, som nå må restilles til permanent løsning.
- 2. Utomhusarbeider:** Disse har blitt avvventet i påvente av at prosjektets rigg- og lagerområder rundt sykehuset skulle bli avviklet og ryddet. Revisjon av utomhusplanen er i slutfasen, og tilbudsinnhenting på detaljprosjektering pågår. Anbudsdokumenter for bygging er planlagt ferdigstilt våren 2023, med byggestart mai/juni 2023.
- 3. Helikopterplattform:** Luftfartstilsynet har ifm tilsyn utført 08.07.20, dvs etter at plattformen stod ferdig, valgt å stille særkrav om etablering av skumanlegg ihht brann- og redningskategori H2. Dette med bakgrunn i at LT har hatt et forsterket fokus de siste par årene på brann og redning, og på å harmonisere norske krav til internasjonalt regelverk. Det ble søkt om midlertidig dispensasjon fra dette særkravet, og dispensasjon ble gitt i brev av 20.08.21. Med utgangspunkt i dispensasjonen er det innvilget ordinær teknisk- og operativ godkjenning fram til 20.08.26. Permanent skumanlegg må være etablert innen 30.09.23. Plattformen ble tatt i bruk med nevnte

dispensasjon 08.09.21. Anbudskonkurranse for skumanleggets Entrepriise 1 er gjennomført og arbeidene startet opp i september 2022. Den andre av totalt 2 entrepriser er for tiden ute på konkurranse og har planlagt anleggsoppstart i februar 2023.

Videre er organisasjonen Senter for utbygging (SU) tatt ned i takt med slutføringen av prosjektet. Alle fast ansatte er utfaset. Innleid byggeledelse er nå begrenset til å omfatte nødvendig oppfølging av gjenstående etterarbeider.

### **3.0 MILJØ OG AVFALLSHÅNDTERING**

Hovedprosjektet er under avslutning og det vises derfor til tertialrapport T3-2019 for mer utførlig omtale av dette temaet.

Det er ikke meldt om personskader på byggeprosjektet i siste periode.

### **4.0 RISIKOHÅNDTERING**

Risikohåndteringen har vært gjort i følgende bolker:

- Risikovurderinger og ROS-analyser
- SJA
- HMS-arbeidet
- Usikkerhetsvurderinger

ROS-analyser (Risiko og sårbarhetsanalyser) gjøres fortløpende for å avdekke om det er elementer i prosjektet som har for stor risiko (havner på rødt) og finne kompenserende tiltak.

SJA (sikker jobb analyser) gjøres av entreprenørene ofte i samarbeid med byggherren og brukerne. Dette gjøres før oppstart av risikofylte arbeidsoperasjoner.

HMS skal ha stort fokus ved valg i prosjektering og utførelse. På byggeplassen og i tilstøtende driftslokaler avholdes vernerunder. Dessuten er det rutiner på varsling av uønskede hendelser.

Usikkerhetsvurderinger gjøres fortløpende i prosjektet knyttet til fremdrift, økonomi og kvalitet.

### **5.0 STATUS ORGANISASJONSUTVIKLING**

Hele Fløy AB er nå tatt i bruk. For beskrivelse av forberedende prosesser før ibruktaking vises det til tidligere tertialrapporter.

### **6.0 STATUS GEVINSTREALISERING**

Forutsetningene knyttet til gevinstrealisering for byggeprosjektet fremgår av Konseptrapport for modernisering av Nordlandssykehuset som ble behandlet i styresak 046-2006.

Finansieringsplanen la til grunn en samlet årlig effektivisering av driften ved ferdigstilling på 64 mill. kr. Ut fra premissene som ble lagt til grunn i styresak 046-2006 har Nordlandssykehuset realisert gevinster ut over disse forutsetningene.

Eableringen av klinikkmodell i 2009 har vært en viktig forutsetning for arbeidet med effektivisering av pasientflyt og arbeidsprosesser. Et vesentlig bidrag til gevinstrealisering i perioden har vært den betydelige omleggingen fra døgn til dag, som har frigjort ressurser knyttet til sengepostdrift, og muliggjort effektivisering av pasientforløp gjennom økt kapasitet på poliklinikker og sammedagskirurgi. Det er siden 2009 også gjennomført en rekke effektiviseringstiltak innenfor foretakets service- og støttefunksjoner som har bidratt til kostnadsreduksjon. Gjennomsnittlig gevinstrealisering i perioden 2010-2019 er tidligere beregnet til 80-100 mill. kr hvert år. De gjennomførte effektiviseringstiltakene omfatter hele foretaket, men en vesentlig andel er knyttet til somatikk Bodø.
